



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA

DOMICILIO: LEON, GTO.

LOCALIDAD: LEON, GTO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HUMORA S.A. DE C.V.


REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC 3709-2015


ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	F 5051-K100310-61401-D/0003/2025	DE FECHA	28/02/2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 2,562,715.94		
INICIO S/CONTRATO:	17/03/2025	INICIO REAL:	17/03/2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	07/06/2025	TÉRMINO REAL:	07/06/2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 2,562,715.94		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$2,562,715.94

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE


 ARQ. LAURA ELENA BECERRA GAITANA
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA


 ING. EFREN GARCIA AYALA
 Dirección de Supervisión


 ING. INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES
 Supervisión Interna DGOP


 VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.
 Supervisión Externa


 ING. HUGO MORA GONZALEZ
 CONSTRUCTORA HUMORA S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATISTA

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Operado
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Este programa es público, libre de acceso y sujeto a los principios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 2025
 Ramo 33
 Omar Velázquez
 F-doc

Mr. Alejandro Salinas

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR
LEON, GTO.

FECHA
07/08/2025

HORA
11:00 a.m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 04/07/25, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU INTERVENCIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA. LOS TRABAJOS CONTEMPLARON LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE NUEVA, LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL, CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y PORTO CON ARENA, COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO CON TEPETATE EN BANQUETAS, CONCRETO EN BANQUETAS, COLADO DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO, CALAFATEO, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LA HUBIERA.

CONDICIONES DE GARANTIAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		Dorama, Institución de Garantías, S.A.	
NÚMERO	25A07747	FECHA	28/02/2025	MONTO	\$ 768,814.78
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		Dorama, Institución de Garantías, S.A.	
NÚMERO	25A07749	FECHA	28/02/2025	MONTO	\$ 256,271.59
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		Dorama, Institución de Garantías, S.A.	
NÚMERO	25A28639	FECHA	04/07/2025	MONTO	\$ 220,481.58

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado
Ramo 33
-- DIV. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines partidarios a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Open

[Handwritten signatures]

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
ESTIMACION 1	DE: 17/03/25 A: 31/03/25	\$208,701.74			
ESTIMACION 2	DE: 01/04/25 A: 30/04/25	\$531,116.32			
ESTIMACION 3	DE: 01/05/25 A: 24/05/25	\$234,153.88			
ESTIMACION 4	DE: 25/05/25 A: 31/05/25	\$380,519.10			
ESTIMACION 5	DE: 01/07/25 A: 06/07/25	\$520,019.73			
ESTIMACION 6 FINIQUITO	DE: 06/07/25 A: 07/07/25	\$330,305.08			

SUBTOTAL	\$2,204,815.85	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:			
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =	\$2,204,815.85		
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:			

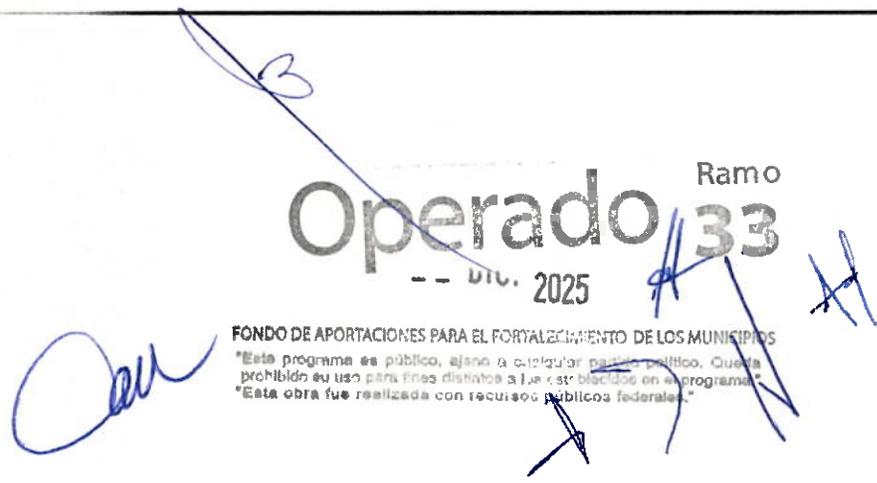
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =	\$0.00			

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$2,204,815.85
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$357,900.09



Operado

 -- DIC. 2025

Ramo **33**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 *Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
