



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

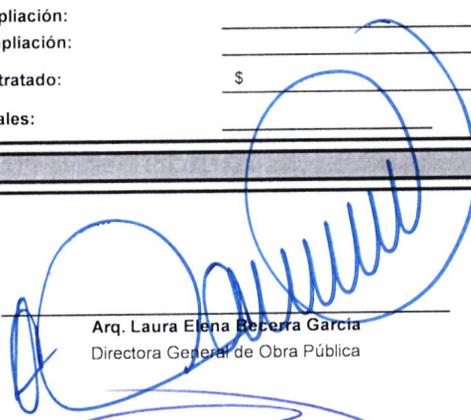
Obra: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN MIGUEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.
Domicilio: LEON, GUANAJUATO.
Localidad: LEON, GUANAJUATO.
Contratista: BEEBSA S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-0074-1999

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-1816-K100350-61301-D/0100/2025	de fecha	23 DE ABRIL DEL 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 2,353,125.16		
Inicio S/Contrato:	12 DE MAYO DEL 2025	Inicio real:	12 DE MAYO DEL 2025
Término S/Contrato:	02 DE AGOSTO DEL 2025	Término real:	09 DE JULIO DEL 2025
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 2,353,125.16		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$2,353,125.16

Intervienen

Por la contratante


Arq. Laura Elena Becerra Garcia
Directora General de Obra Pública


Ing. Gerardo Ortiz Chavez
Subdirector General de Ejecucion de Obra y Mantenimiento


MTRO. ING. JAVIER GARCIA GONZALEZ
Supervisión Interna DGOP

N/A
Nombre del representante legal / empresa de supervisión
Supervisión externa

Por el Contratista


ING. OSCAR ENRIQUE VILLALOBOS OÑATE
BEEBSA S.A. DE C.V.

Por el (los) órgano(s) de control


Eusebio Hernandez
Contraloría Municipal

Operado 33
-- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."
N/A

Secretaría de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar
LEON GTO

Fecha
20/08/2025

Hora
13:40 HORAS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 25/07/2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SE REALIZO LA INSTALACION DE LUMANRIAS AUTOBAHN 115W, LUMINARIAS TIPO LED PARA PUNTA DE POSTE DE 80W, LUMINARIAS ATBS MARCA ACUITY DE 76W, LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR MOD, NIGHT FALCON DE 128W COLOR BLANCO, POSTES DE CONCRETO DE 9 Y 11 MTRS. DE ALTURA, POSTES CONICO CIRCULAR LAMINA CAL. 11 MARCA POLESA EN DIFERENTES MEDIDAS, CABLE NEUTRANEL 600V (2+1) CAL. 4., CABLE XLPE V600 (2+1) CLA. 4. POLIDUCTO PAD 51MM, CALE DE COBRE DESNUDO Y CABLE THW CAL.10, REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADO 40 X 40 X 60 CMS., BASES DE CONCRETO PREFABRICADO SECCION PIRAMIDAL 40 X 40 CMS. EN LA CORONA Y 75 CMS. DE ALTUTA, EN LA DISTINTAS COLONIAS; LOS FRESNOS, BARRIO DE SAN MIGUEL, RESIDENCIAL ARBIDE, LOMAS DEL MIRADOR, EL SAUCILLO, CAÑADA DEL REAL, CONVIVE, OBREGON, OBRERA, BUENOS AIRES, LA MARTINICA, LEON MODERNO, SANTO DOMINGO, SANTA MARIA DEL GRANGENO Y AV. JUAREZ

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY		
Número	2336284	Fecha	23/04/2025	Monto	\$ 705,937.55
De cumplimiento	X	Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY		
Número	2336290	Fecha	23-04-2025	Monto	\$ 235,312.51
De vicios ocultos	X	Afianzadora	CHUBB FIANZAS MONTERREY		
Número	2354351	Fecha	25/07/2025	Monto	\$ 235,312.51

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 12/05/2025 A: 31/05/2025	\$339,599.92			
2	De: 01/06/2025 A: 30/06/2025	\$1,778,197.70			
3 (FINIQUITO)	De: 01/07/2025 A: 09/07/2025	\$235,327.54			
	De: A:				
	De: A:				

Operado 33
Ramo
MAY 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

De:				
A:				
De:				
A:				
De:				
A:				

Subtotal	\$2,353,125.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,353,125.16
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$434,289.01		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$48,168.19		

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
De:					
A:					

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small>				

SUMA TOTAL:		\$2,353,125.16		
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$0.00		

Operado Ramo **33**
 -- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
